



Ontwikkeling KindCentrum Eenrum

[Nieuwsbrief over de ontwikkeling van KindCentrum Eenrum]

[september 2018, 4e nieuwsbrief]

[Nieuwsbrief voor ouders, omwonenden, verenigingen en instanties en andere belangstellenden]

Een verkorte nieuwsbrief met betrekking tot de bouw om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken en het tijdpad.

Maandag a.s. vindt er een overleg plaats tussen gemeente De Marne en ons schoolbestuur met als belangrijkste punt de schoolomgeving. Op het moment dat daar meer informatie over bekend is, laten we u dat weten.



In deze nieuwsbrief:

- ✓ Stand van zaken?
- ✓ Tijdpad
- ✓ Contactgegevens




leerplein gr 7/8 en werkruimte 1



lokaal groep 7

toiletten groep 7/8

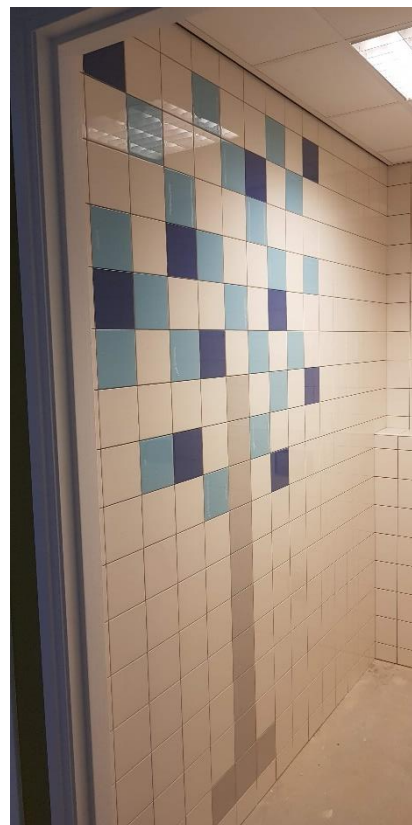

Stand van zaken

Vorige week hebben we van de aannemer de nieuwste planning ontvangen. De planning hebben we deze week met het team besproken en vervolgens weer teruggekoppeld aan de aannemer.

Nog een aantal weken wordt er een beroep gedaan op onze flexibiliteit, maar het einde is in zicht!

Op dit moment worden de vloeren in de oude bibliotheek geëgaliseerd. Na uitharding, kan het nieuwe marmoleum worden geplaatst. Aangezien dit in het gehele gebouw moet gebeuren, is dit een enorme klus, dat meer dan 6 weken in beslag gaat nemen. Vloeren moeten namelijk ook drogen. Op dat moment kunnen de vloeren ook niet belopen worden. Dit vraagt om een goede planning.

De meeste plafonds zitten er inmiddels in. De tegelzetter betegelt de toiletten en de schilders zijn nagenoeg klaar in de "oude bibliotheek" en bij de "onderbouw". De voordeuren zijn geplaatst en de kozijnen komen er ook binnenkort in.

Groep 8 zal voor de herfstvakantie al verhuizen, zodat het lokaal verbouwd kan worden voor de buitenschoolse opvang. In deze ruimte zal de BSO gaan plaatsvinden. Uiteraard staat straks het atelier (huidige groep 7) ook tot de beschikking van de kinderen.

In de herfstvakantie wordt gestart met de hellingbaan bij het podium. Deze is nodig om het hoogteverschil te overbruggen. U kunt straks met de kinderwagen van het hogere naar het lagere gedeelte. In de vakantie worden ook de toiletten tussen groep 3 en 4/5 gesloopt. De keukens worden in de verbouwde ruimtes ook deze geplaatst.

Daarnaast zal er gestart worden met het verwijderen van de vloeren in de lokalen en middenruimte. Dit moet vervolgens weer geëgaliseerd worden en daarna kan het marmoleum gelegd worden. Hierdoor moeten alle ruimtes leeg! Een enorme klus, dat kunt u zich wel voorstellen.

De groepen 3, 4/5 en 6 zullen dan tijdelijk naar de ruimtes van de onderbouw verhuizen. De kinderen helpen ons hier vrijdagochtend voor de herfstvakantie bij en 's middags zijn de kinderen vrij. Het team zal dan verder de ruimtes inrichten, zodat we na de herfstvakantie goed kunnen starten. De margedag na de herfstvakantie komt dan ook te vervallen.

Rondom het gebouw zullen de hekken, rijplaten en containers de komende tijd ook gaan verdwijnen. Uiteraard blijven een aantal hekken i.v.m. de veiligheid staan.

In overleg met alle partijen aan de Plantsoenstraat, hebben we ervoor gekozen om i.v.m. de rust, duidelijkheid en structuur, de kinderen tot aan de **kerstvakantie** hier te laten. De feestmaanden staan voor de deur en we willen daardoor niet te veel veranderingen voor de kinderen. Daarnaast kan er ook druk gewerkt worden aan de buitenomgeving, zonder dat daar kleuters in de buurt rondlopen. Dit is wel zo veilig.

Al naar gelang de oplevering en levering van nieuw meubilair, gaan we kijken wanneer we gaan verhuizen. We hopen dat het nieuwe meubilair dan geleverd kan

worden, zodat we alle meubels aan de Plantsoenstraat niet weer hoeven te verhuizen.

Als alles volgens plan loopt is de verbouwing halverwege november klaar. We kijken er naar uit!

Voor in de agenda



Tijdpad

- Vrijdag 12 oktober verhuizing groep 8 naar het nieuwe lokaal.
 - Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur de vrij i.v.m. verhuizing.
 - Herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
 - Maandag 29 oktober GEEN verhuisdag; kinderen gaan gewoon naar school
 - Groep 1 en 2 aan Plantsoenstraat
 - Nieuwe ingang via toegang grote plein langs het speellokaal
 - Groep 6 oude speellokaal
 - Groep 4/5 lokaal 2 onderbouw
 - Groep 3 lokaal 1 onderbouw
 - Groep 7 nieuwe lokaal
 - Groep 8 nieuwe lokaal
- De kantoorruimtes zullen door het ondersteunend personeel in gebruik worden genomen. Zij zijn via de ingang van de oude bibliotheek te bereiken.

Onderstaande data zijn onder voorbehoud van de oplevering, verhuizingen en levering nieuw meubilair.

- Maandag 7 december verbouwing klaar?
- Woensdag 2 januari Kinderopvang op nieuwe locatie
- Maandag 7 januari start peuterspeelzaal op nieuwe locatie
- Maandag 7 januari start groep 1 en 2 op nieuwe locatie
- Mogelijk verhuisdagen 21 december of 7 januari (onder voorbehoud) Dit is afhankelijk van de oplevering en levering nieuw meubilair)

Informatie

Contactpersoon: Peter Loonstra

KindCentrum Eenrum

Adres: Hunse 2, 9967 PS Eenrum

Tel: 0595 492080

Email: p.loonstra@lauwerseneems.nl

Website: www.octopuseenrum.nl klik op Kindcentrum

Facebook:

<https://www.facebook.com/kindcentrumeenrum>

Heeft u vragen? Kom gerust langs!

